Äimäraution siirtolapuutarha, aikataulu
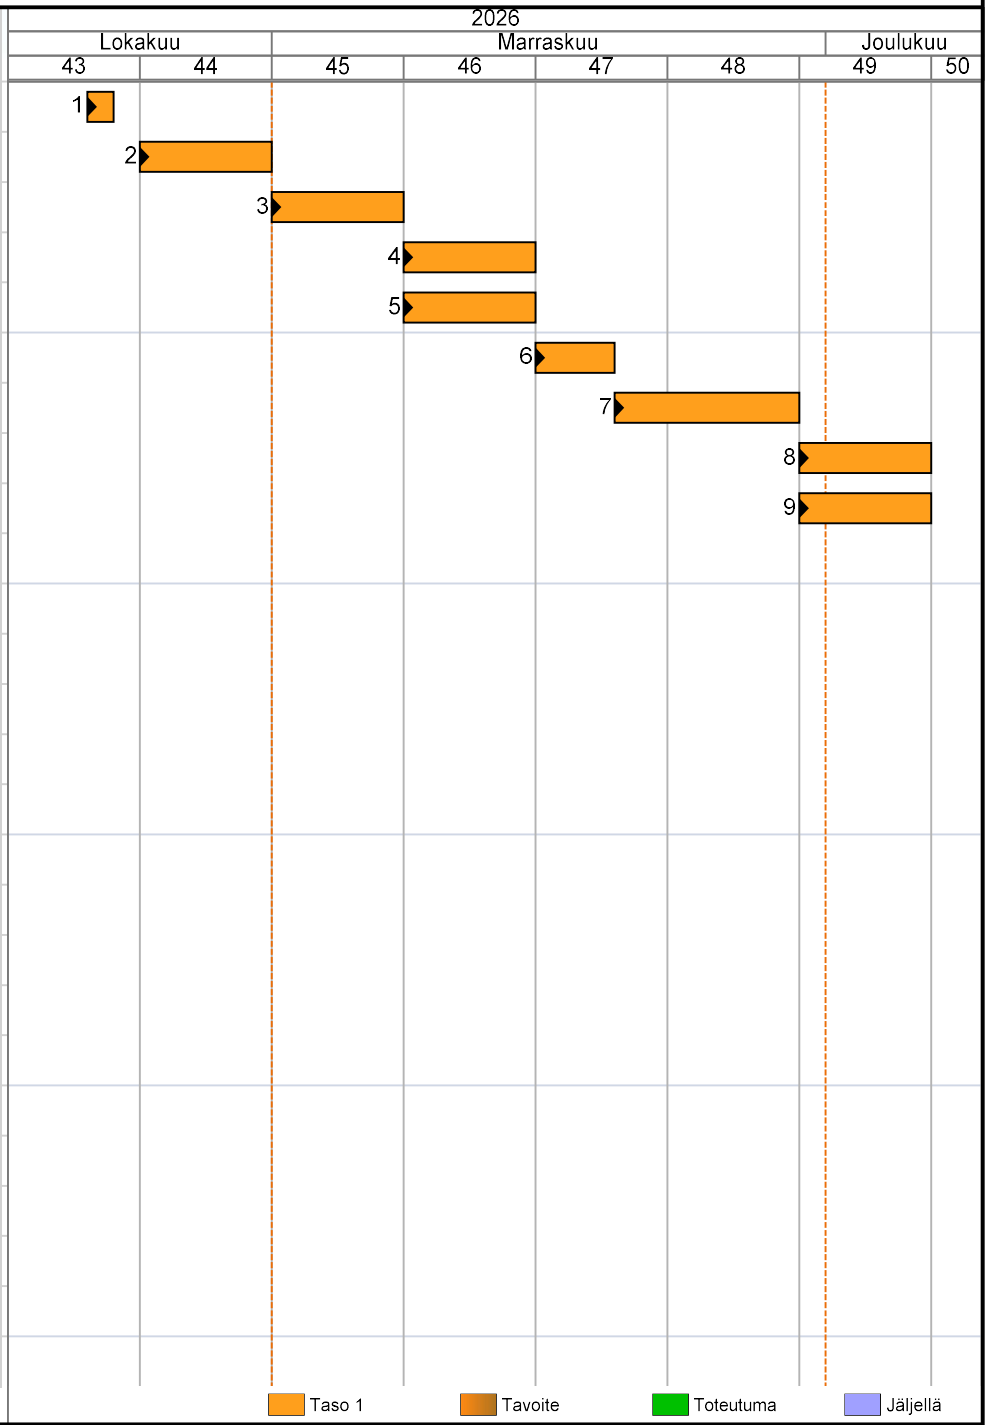
	Hier	Nimi	Kesto	Alku	Loppu
1 *	1	Työmaan perustaminen	1 pv	22.10.26	22.10.26
2 *	2	Kielontie, Maanleikkaus	5 pv	26.10.26	30.10.26
3 *	3	Kielontie, Rakennekerrokset	5 pv	02.11.26	06.11.26
4 *	4	Kielontie, Viimeistely- ja vihertyöt	5 pv	09.11.26	13.11.26
5 *	5	Kielontie, metsän raivaus ja ojan perkkaus	5 pv	09.11.26	13.11.26
6 *	6	Kielontie, rummun vaihto 1000mm	3 pv	16.11.26	18.11.26
7 *	7	Kullerontie, Rakennekerrokset ja hulevede	7 pv	19.11.26	27.11.26
8 *	8	Kullerontie, Viimeistely- ja vihertyöt	5 pv	30.11.26	04.12.26
9 *	9	Sähkötyöt	5 pv	30.11.26	04.12.26
